



bluesource - mobile solutions gmbh
Softwarepark 35
A-4232 Hagenberg
Tel.: +43-7236-3343-900
Fax: +43-7236-3343-909
E-mail: office@bluesource.at
www.bluesource.at

Hagenberg, 02.10.2009

Besprechung Projektstatus Europlan

Termin: 02.10.2009, 07:00 – 09:30

Teilnehmer:

Hr. Harreither
Hr. Harreither T.
Hr. Hofmarcher
Hr. Sprengseis
Hr. Stockner

1. Aktueller Projektstatus

Das Projekt Europlan 2.0 ist budgetär soweit im Plan, durch das Tagesgeschäft jedoch terminlich etwas in Verzug. Hr. Sprengseis und Hr. Stockner werden Anfang KW 41 einen Plan erstellen und die nächsten Milestones in kleinere Arbeitspakete aufteilen. Somit wird die Planung und Kontrolle verbessert sowie weitere Workshops und die Inbetriebnahme erleichtert.

Folgende Rahmenbedingungen / Deadlines wurden vorab festgelegt:

- Fertigstellung der Planung und Optimierung bis Ende KW48 (Ende November)
- Fertigstellung des Programms inkl. Materialauszug und Kalkulation zur Ausrollung an die Fa. Harreither sowie an Partner, die ebenfalls an Tests teilnehmen sollen, bis Anfang KW 51 (14. Dezember).
- Testbetrieb bis Mitte Jänner; In dieser Zeit soll parallel das Bugfixing stattfinden.
- Finales Roll-Out der Software muss spätestens am 25. Jänner stattfinden.

2. Graphische Komponente

Die graphische Komponente für Europlan 2.0 soll so schnell als möglich realisiert werden. Dazu wird parallel zur Entwicklungsarbeit der Basisfunktionalität ein Framework gesucht, das die Darstellung und Planung der Harreither Produkte vereinfacht.

Hr. Sprengseis hält eine Auswahl einer solchen Komponente in einem Zeitraum von 3 Mannwochen für realistisch. Es sollen mehrere Produkte im Funktionsumfang verglichen werden. Der Fa. Harreither wird eine Kurzanalyse der Komponenten vorgelegt, die als Entscheidungsgrundlage für den Zukauf der Komponente dienen soll.

3. Allgemeine Projektabwicklung

Es wird ein Zugang zum bluesource Bug-Reporting-System für die Fa. Harreither auf Personen-Ebene hergestellt. Im ersten Schritt wird Hr. Hofmarcher und Hr. Harreither T. ein Login auf das System eingerichtet, auf Bedarf können weitere Personen hinzugefügt

werden.

Im Reporting System werden allenfalls auftretende Fehler dokumentiert, einem Programmierer der Firma bluesource zugewiesen und der aktuelle Status des Fehlers wird dokumentiert.

Im Feld „Resolution“ soll angegeben werden, in welcher Version die Korrektur tatsächlich ausgerollt wird.

4. Feedback zur Flächenaufstellung

Die Flächenaufstellung wird bereits hausintern benutzt und stößt allgemein auf große Akzeptanz. Hr. Sprengseis wurden Korrekturwünsche übermittelt, diese werden in das Bugtracking System eingetragen. Desweiteren wurde ein Entwurf für das Layout des Reports für die Flächenaufstellung übermittelt, der bis zum nächsten Software-Release realisiert wird.

5. Fragen zur Planung / Optimierung Klima Boden, Klima Decke

Die Planung und Optimierung von Modul-Klimaboden und Klimadecke wurde in Europlan 1.0 noch nicht abgedeckt.


Es wurde darüber diskutiert, ob zur Planung von Modul-Klimaboden/decke ein Belegungsfaktor gewählt werden soll oder bereits Module inklusive deren Größen in Europlan 2.0 eingegeben werden sollen.

Da bei der graphischen Auslegung der Module bereits definierte Modulgrößen und Verbindungsleitungen verplant werden, wird auch im ersten Schritt eine Eingabe der Module und deren Anbindung in einer Art Raster (Tabelle) realisiert.

Bei der Eingabe der Module müssen folgende Grenzen berücksichtigt werden:

- Es dürfen maximal 20 Module in Serie verplant werden
- Es dürfen maximal 6 Modulreihen parallel verplant werden
- Die maximale Anzahl an Modulen an einer Anbindung darf 50 nicht überschreiten
- Die Heizleistung ist unabhängig von der Modulgröße (hier zählen nur die verplanten qm), nicht jedoch der Druckverlust!

Im ersten Schritt soll es möglich sein, einem Raum mehrere Raster an Modul-Klimaboden/Decke hinzuzufügen. Ein Mapping eines Plans auf die Europlan Eingabe soll unten stehendes Bild veranschaulichen:

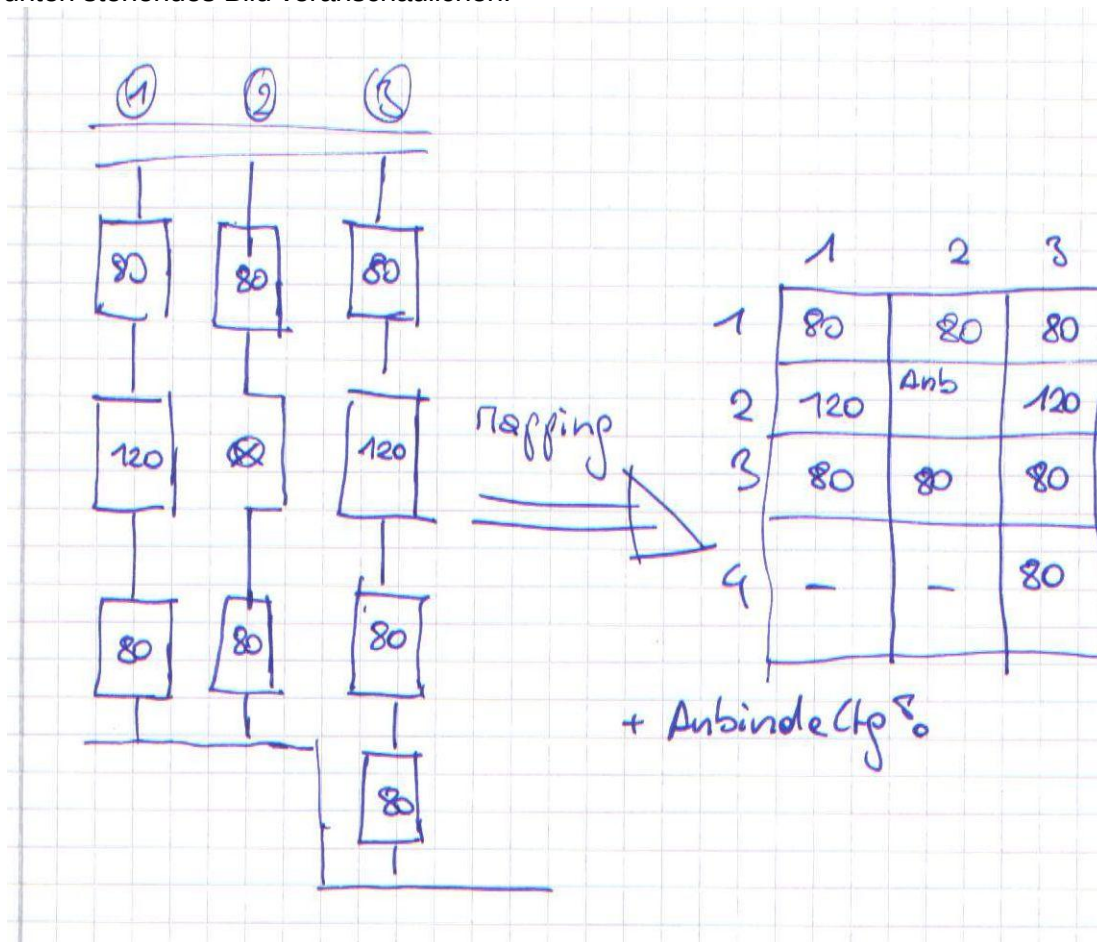

6. Offene Fragen zur Planung Euroval

Es wurden per Email zwei Fragen an Hr. Harreither T. und Hr. Hofmarcher übermittelt. Diese Fragen behandelten die Themen „Spreizung“ sowie „Randzonenbreite“.

Zum Thema Randzone wurde bemerkt, dass diese vom Planer eingegeben werden muss. Die Harreither Norm für die Oberflächentemperatur bei Randzonen beträgt 2°K unter der ÖNorm, somit 33°C.

Bei der automatischen Berechnung der Randzone und der Aufenthaltszone sollte jedenfalls darauf geachtet werden, dass zumindest eine Art des Verlegungsabstandes „ausgelassen“ wird.

Somit sollte für die automatische Berechnung gelten:

- RZ EV5 => AZ mind. EV15
- RZ EV10 => AZ mind. EV20
- ...

Zum Thema Spreizung hat Hr. Hofmarcher den Hinweis gegeben, sich die Einflußgrößen „Vorlauftemperatur“ und „Raumtemperatur“ nochmals anzusehen. Die Spreizung wird von diesen beiden Größen beeinflusst.

7. ToDo's

- Bluesource – Erstellung eines detaillierten Zeitplans bis zur Testphase von Europlan 2.0 um weitere Workshops zeitgerecht planen zu können (Beginn KW 41).
- Bluesource – Einrichten des Bugtracking Systems für Zugriffe der Fa. Harreither (Beginn KW41).
- Bluesource – Eintragen der Änderungswünsche der Fa. Harreither in Bugtracking System (Beginn KW41).
- Harreither – Weiterer Input bzgl. der Planung von Modul Klimaboden/Klimadecke (Beginn KW41).
- Bluesource/Harreither – Koordinierung der weiteren Termine für Workshops, Abnahmen (Ende KW41).
